



ИНИЦИАТИВНОЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
ЮГРЫ



«Семейный парк: первые шаги к рекордам I этап»

С.П. ПЕРЕГРЕБНОЕ
Д.НИЖНИЕ НАРЫКАРЫ,
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН,
ХМАО - ЮГРА



МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА:



- Ул. Почтовая 7А, с.п. Перегребное д. Нижние Нарыкары, Октябрьский район, ХМАО - Югра





ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:



Цель проекта:

- Подготовить территорию площадью 502 м² к установке элементов благоустройства: выполнить планировку, устройство основания и укладку резинового покрытия во всех активных зонах, оборудовать пешеходные дорожки.

Задачи проекта:

- Очистить участок от мусора, поросли и существующих разрушенных конструкций.
- Выполнить вертикальную планировку территории с уклоном для отвода воды.
- Устроить дренирующее основание (песчано-гравийная подушка) и бетонное или асфальтовое основание под резиновое покрытие.
- Уложить резиновое покрытие (литьевое или плиточное) на всех игровых и спортивных зонах согласно проекту (зоны под комплекс, качели, тренажёры, скамейки, дорожки).
- Обустроить центральную пешеходную дорожку из плитки шириной 2,5 м.
- Установить временное ограждение (или оставить на следующий этап, в зависимости от бюджета).



АКТУАЛЬНОСТЬ И ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:



В настоящее время в д. Нижние Нарыкары отсутствует современная, безопасная, освещённая и огороженная площадка для активного отдыха детей школьного возраста и занятий спортом для взрослых. Существующие дворовые пространства не оборудованы в соответствии с требованиями безопасности (нет амортизирующего покрытия, ограждений, качелей, тренажёров).

Проект направлен на решение следующих проблем:

- Отсутствие места для активных игр детей 5–12 лет.
- Невозможность занятий спортом на свежем воздухе для взрослых (нет тренажёров, турников).
- Небезопасность прогулок в тёмное время суток.
- Отсутствие комфортных мест отдыха для мам с колясками и пожилых людей.
- Риск выхода детей на проезжую часть (нет ограждения).

Первый этап позволит создать безопасную, ровную и долговечную поверхность, на которой в будущем можно будет монтировать игровые комплексы, тренажёры, качели и скамейки без дополнительных затрат на переделку основания.



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:



· ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (до начала строительных работ)

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
1.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии между муниципальным образованием и Департаментом финансов ХМАО – Югры	Май 2027	Администрация сельского поселения	Подписанное соглашение, открытие финансирования
1.2	Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации (в соответствии с 44-ФЗ или 223-ФЗ)	Май – июнь 2027	Администрация сельского поселения	Заключённый муниципальный контракт с подрядчиком
1.3	Уточнение схемы размещения оборудования и технического задания с подрядчиком	Июнь 2027	Инициативная группа, подрядчик, администрация	Утверждённая рабочая документация
1.4	Получение разрешения на производство работ (при необходимости)	Июнь 2027	Подрядчик	Разрешение на строительство / ордер на производство работ
1.5	Информирование жителей о начале работ (объявления, соцсети, стенды)	За 5–7 дней до начала	Инициативная группа	Информированность населения



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:



• ЭТАП 2. ОСНОВНОЙ (строительно-монтажные работы)

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
2.1.1	Ограждение строительной площадки (временное)	1–2 день	Подрядчик	Безопасная зона производства работ
2.1.2	Демонтаж старых конструкций (если имеются)	1–2 день	Подрядчик	Территория очищена от старых элементов
2.1.3	Вывоз строительного мусора и порубочных остатков	2–3 день	Подрядчик, волонтеры	Территория полностью очищена
2.1.4	Выравнивание грунта, планировка участка	3–5 день	Подрядчик	Ровная поверхность с уклоном 1–2% для отвода воды
2.1.5	Разметка зон в соответствии со схемой проекта	5 день	Подрядчик, инициативная группа	Чёткая разметка всех функциональных зон



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:



• 2.2. Устройство основания

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
2.2.1	Устройство песчано-гравийной подушки (толщина 15–20 см)	6–8 день	Подрядчик	Дренирующее основание готово
2.2.2	Укладка геотекстиля (разделительный слой)	8–9 день	Подрядчик	Защита от прорастания растений и смешивания слоёв
2.2.3	Устройство бетонного или асфальтового основания под резиновое покрытие (толщина 8–10 см)	10–14 день	Подрядчик	Твёрдое ровное основание для резинового покрытия
2.2.4	Устройство бордюров по краям зон и дорожек	14–16 день	Подрядчик	Чёткое разграничение зон



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:



• 2.3. Укладка резинового покрытия и устройство дорожек

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
2.3.1	Укладка резинового покрытия в зоне Б (игровой комплекс, светло-зелёный цвет, ≈ 100 м²)	17–20 день	Подрядчик	Резиновое покрытие уложено
2.3.2	Укладка резинового покрытия в зоне Д (качели, голубой цвет, ≈ 64 м²)	20–22 день	Подрядчик	Резиновое покрытие уложено
2.3.3	Укладка резинового покрытия в зоне В (тренажёры, светло-розовый цвет, ≈ 48 м²)	22–24 день	Подрядчик	Резиновое покрытие уложено
2.3.4	Укладка резинового покрытия в зоне Е (скамейки, бежевый цвет, ≈ 24 м²)	24–25 день	Подрядчик	Резиновое покрытие уложено
2.3.5	Устройство центральной дорожки (плитка / брусчатка, ширина 2,5 м, длина 18 м)	17–22 день	Подрядчик	Центральная дорожка готова
2.3.6	Устройство второстепенных дорожек и подходов к зонам	22–25 день	Подрядчик	Все дорожки готовы



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:



2.4. Завершающие работы первого этапа

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
2.4.1	Установка временного ограждения (или оставление разметки под постоянное ограждение на 2 этап)	25–27 день	Подрядчик	Безопасность территории
2.4.2	Установка информационного щита с описанием проекта и схемой	27–28 день	Инициативная группа, подрядчик	Информирование жителей о ходе работ
2.4.3	Уборка территории после завершения работ	28–29 день	Подрядчик, волонтеры	Чистая, готовая к эксплуатации территория



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:



· ЭТАП 3. ПРИЁМОЧНЫЙ (контроль и отчётность)

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
3.1	Внутренняя приёмка работ инициативной группой	30 день	Инициативная группа	Акт осмотра, выявление замечаний (при наличии)
3.2	Устранение выявленных недостатков (при необходимости)	31–33 день	Подрядчик	Устранённые замечания
3.3	Подписание акта выполненных работ (КС-2, КС-3)	34 день	Подрядчик, администрация, инициативная группа	Акт приёма-передачи выполненных работ
3.4	Подготовка отчёта о реализации первого этапа для администрации и Департамента финансов	35–37 день	Администрация, инициативная группа	Отчёт направлен, подтверждение освоения средств
3.5	Публикация информации о завершении первого этапа в соцсетях и СМИ	38 день	Инициативная группа	Информированность жителей о завершении работ



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:



· ЭТАП 4. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ (планируемые на 2027–2028 годы)

№	Мероприятие	Планируемый срок
4.1	2 этап: установка игрового комплекса, тренажёров, качелей, скамеек, урн	Август – сентябрь 2027
4.2	3 этап: монтаж основного ограждения по периметру, установка опор освещения	Сентябрь – октябрь 2027
4.3	4 этап: озеленение (посев газона, высадка кустарников), благоустройство прилегающей территории	Май – июнь 2028
4.4	Торжественное открытие парка	Июнь 2028



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВОГО ЭТАПА:



- Территория очищена и спланирована.
- Подготовлено ровное, дренированное основание для будущего оборудования.
- Уложено резиновое покрытие во всех активных зонах (236 м²), готовое к эксплуатации и безопасное для передвижения.
- Обустроена центральная дорожка, обеспечивающая доступ ко всем зонам.
- Создана база для второго этапа – установки игрового комплекса, тренажёров, качелей, скамеек, ограждения и освещения.




ПЛАНИРУЕМЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА:



- Начало работ: июнь 2027 года (после утверждения финансирования).
- Окончание работ: август 2027 года (длительность – 2–3 месяца, с учётом завоза материалов и погодных условий).



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:

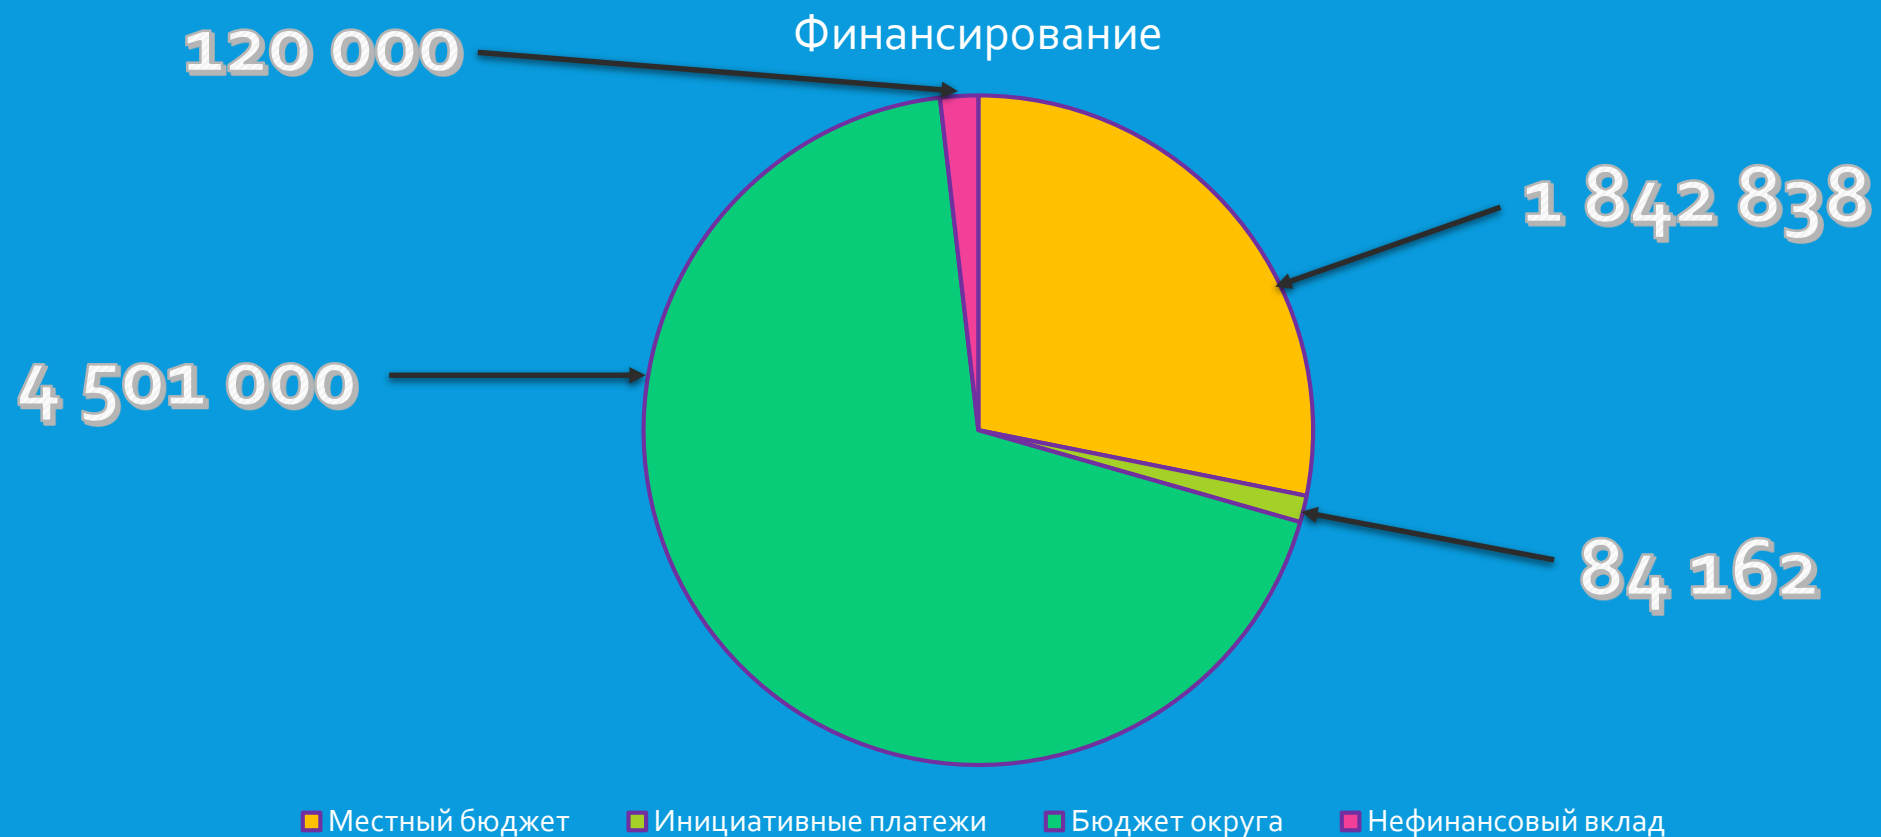



СВЯЗЬ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ:

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

- **Национальная цель: «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»**
- **Целевые показатели, на которые влияет проект:**
- **Снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом.**
- *Прямое влияние проекта:* создание современной спортивной инфраструктуры (уличные тренажёры, игровой комплекс, качели) привлекает взрослых и детей к регулярным занятиям физической культурой, что формирует здоровый образ жизни и снижает заболеваемость.
- **Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.**
- *Прямое влияние проекта:* появление в д. Нижние Нарыкары современной, безопасной и освещённой площадки с игровым и спортивным оборудованием значительно повысит доступность и качество условий для занятий спортом, что напрямую отразится на уровне удовлетворённости жителей.






СВЯЗЬ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ:

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

- Национальная цель: «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»
- Целевые показатели, на которые влияет проект:
- Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов.
- *Прямое влияние проекта:* проект реализуется с активным участием волонтеров и инициативной группы. Жители деревни, включая молодёжь, вовлекаются в общественную деятельность: обсуждение проекта, субботники, информирование соседей, контроль за строительством. Это формирует социальную ответственность и гражданскую активность.

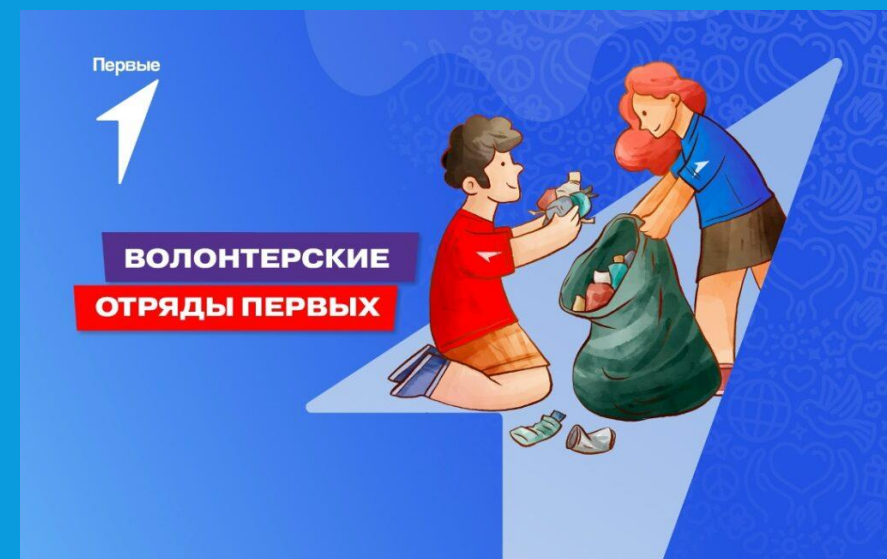




СВЯЗЬ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ:

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»

- Целевые показатели, на которые влияет проект:
- Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.
- *Прямое влияние проекта:* устройство ограждения по периметру площадки предотвращает выход детей на проезжую часть, что напрямую снижает риск детского дорожно-транспортного травматизма и, как следствие, способствует снижению смертности в ДТП.

Смертность в ДТП

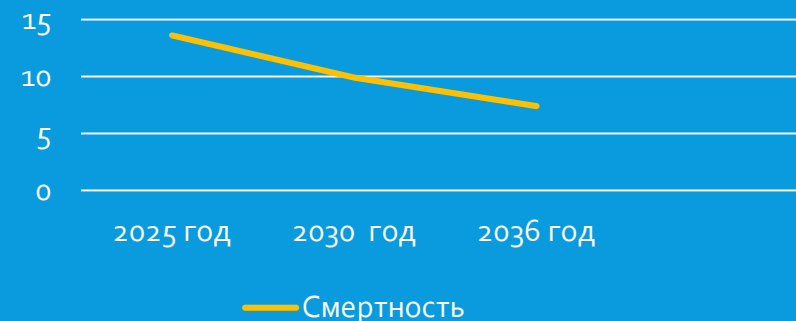




ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА:



Кетова Елена
Владимировна



Григорян Сусан
Сашаи



Князева Евгения
Юрьевна




Иванова Галина
Станиславовна




Иванов Сергей
Павлович



Бобко Татьяна
Юрьевна

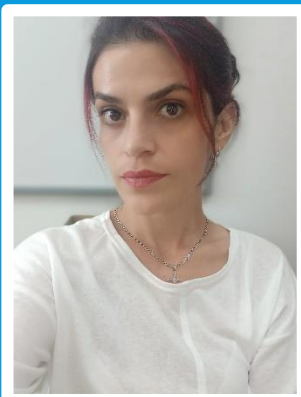

Хачатурян Вартитер
Суреновна

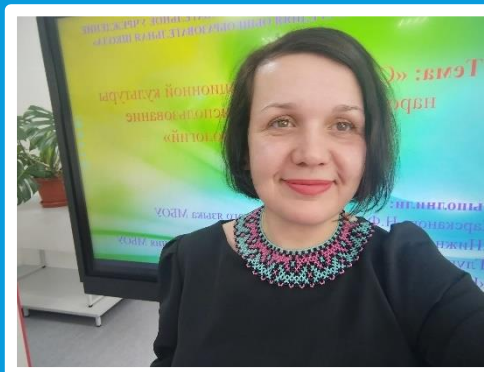

Карсканова Наталья
Фаритовна



Силина Ольга
Георгиевна



Глушкова Вера
Александровна



Юруткина Юлия
Алексеевна



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ИТОГАМ 2 ЭТАПОВ:

